Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	**ЖИВОТНОВОДСТВО**	**543 дней**	**Чт 01.02.07**	**Вс 27.07.08**
2	Разработка концептуального проекта животноводческого комплекса	21 дней	Чт 01.02.07	Ср 21.02.07
3	Оценка существующих производственно-технических мощностей	14 дней	Чт 01.02.07	Ср 14.02.07
4	Изучение и выбор пород КРС с учетом требований технологий экологически чистого производства	21 дней	Ср 14.02.07	Вт 06.03.07
5	Определение технологий и оборудования, используемых в животноводческом комплексе	21 дней	Ср 14.02.07	Вт 06.03.07
6	Разработка в первом приближении ТЭО производства и переработки экологически чистой мясо-молочной продукции	14 дней	Ср 14.02.07	Вт 27.02.07
7				
8	Разработка и согласование рабочего проекта реконструкции существующих ферм на 100-200 голов дойного стада	63 дней	Пн 12.02.07	Вс 15.04.07
9	Разработка и согласование рабочего проекта строительства навозохранилищ	63 дней	Пн 30.04.07	Вс 01.07.07
10	Разработка и согласование рабочего проекта строительства кормоцеха	63 дней	Пн 02.04.07	Вс 03.06.07
11	Разработка и согласование рабочего проекта строительства (реконструкции) ветеринарного пункта	35 дней	Пн 04.06.07	Вс 08.07.07
12	Разработка и согласование рабочего проекта строительства скотомогильника для утилизации павших животных	35 дней	Пн 18.06.07	Вс 22.07.07
13	Разработка и согласование рабочего проекта строительства новых ферм на 200-400 голов дойного стада	179 дней	Чт 01.02.07	Вс 29.07.07
14				
15	Реконструкция существующих ферм	112 дней	Пн 16.04.07	Вс 05.08.07
16	Монтаж и наладка оборудования в реконструированных фермах	35 дней	Пн 23.07.07	Вс 26.08.07
17	Строительство навозохранилищ	63 дней	Пн 02.07.07	Вс 02.09.07
18	Строительство кормоцеха	119 дней	Пн 04.06.07	Вс 30.09.07
19	Монтаж и наладка оборудования кормоцеха	28 дней	Пн 17.09.07	Вс 14.10.07
20	Строительство (реконструкция) ветеринарного пункта	49 дней	Пн 16.07.07	Вс 02.09.07
21	Оснащение ветеринарного пункта оборудованием и препаратами	28 дней	Пн 03.09.07	Вс 30.09.07
22	Строительство скотомогильника для утилизации павших животных	49 дней	Пн 23.07.07	Вс 09.09.07
23	Строительство новых ферм на 200-400 голов дойного стада	343 дней	Пн 30.07.07	Вс 06.07.08
24	Монтаж и наладка оборудования в новых фермах	42 дней	Пн 16.06.08	Вс 27.07.08
25				
26	Подбор квалифицированных кадров для работы в животноводческом комплексе	119 дней	Пн 04.06.07	Вс 30.09.07
27	Организация обучения и повышения квалификации имеющихся кадров	112 дней	Пн 06.08.07	Вс 25.11.07
28				
29	Приобретение поголовья КРС для взращивания собственного стада	28 дней	Пн 01.10.07	Вс 28.10.07
30	Приобретение взрослого поголовья КРС	28 дней	Пн 03.09.07	Вс 30.09.07
31	Организация технологического процесса ухода за КРС	70 дней	Пн 27.08.07	Вс 04.11.07
32				
33	Разработка концептуального проекта комплекса по переработке мяса и молока	21 дней	Чт 01.02.07	Ср 21.02.07
34	Оценка существующих производственно-технических мощностей	14 дней	Чт 01.02.07	Ср 14.02.07
35	Определение технологий и оборудования, используемых в комплексе по переработке мяса и молока	21 дней	Ср 14.02.07	Вт 06.03.07
36	Разработка во втором приближении ТЭО производства и переработки экологически чистой мясо-молочной продукции	21 дней	Вт 27.02.07	Пн 19.03.07
37				
38	Разработка и согласование рабочего проекта строительства цеха по переработке мясо-молочной продукции	140 дней	Пн 12.02.07	Вс 01.07.07
39	Строительство цеха по переработке мясо-молочной продукции	336 дней	Пн 02.07.07	Вс 01.06.08
40	Монтаж и наладка оборудования в цехе переработки	49 дней	Пн 12.05.08	Вс 29.06.08
41				
42	Подбор квалифицированных кадров для работы в комплексе по переработке мяса и молока	119 дней	Пн 31.03.08	Вс 27.07.08
43	Организация обучения и повышения квалификации имеющихся кадров	56 дней	Пн 02.06.08	Вс 27.07.08
44				
45	Организация технологического процесса производства молочной и мясной продукции	56 дней	Пн 02.06.08	Вс 27.07.08
46	Организация технологического процесса переработки мясо-молочной продукции	56 дней	Пн 02.06.08	Вс 27.07.08
47	Организация поставки мясо-молочной продукции потребителям	56 дней	Пн 02.06.08	Вс 27.07.08

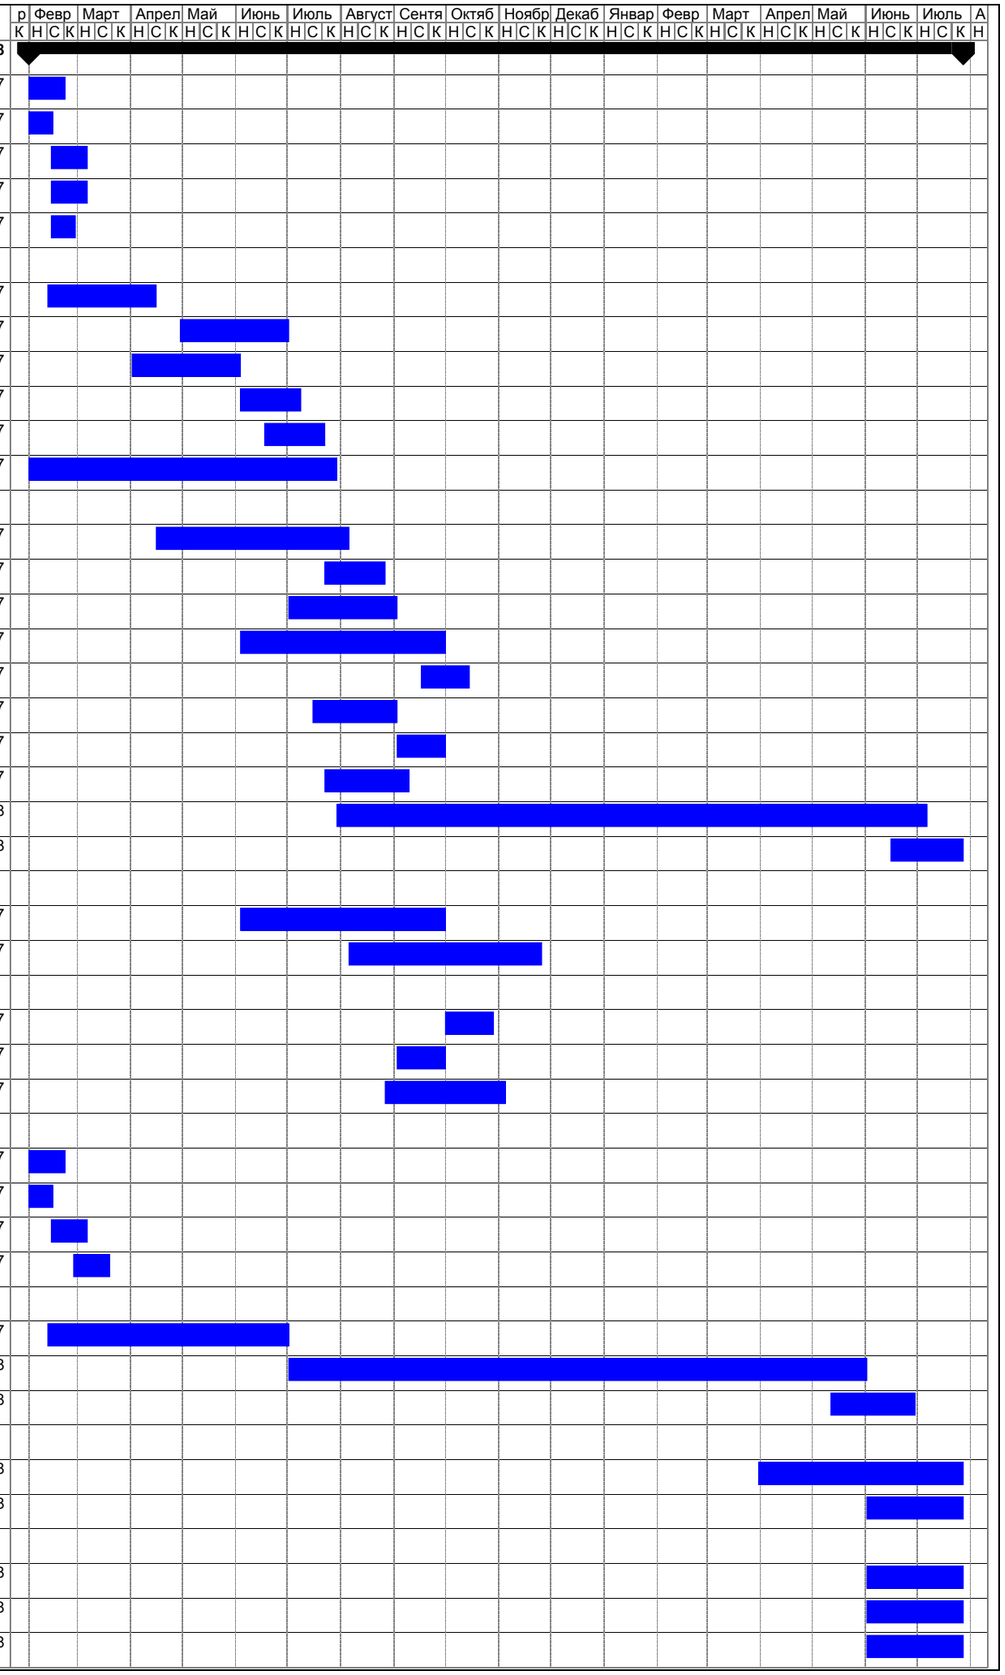
р Февр Март Апрел Май Июнь Июль Август Сентя Октяб Ноябр Декаб Январ Февр Март Апрел Май Июнь Июль А
К Н С К Н С К Н С
